

喀什经济开发区深喀大道东延段与 G3012高速路连接线项目 绩效评价报告

(2023 年度)

项目名称：喀什经济开发区深喀大道东延段与G3012高速路
连接线项目

项目单位：喀什经济开发区规划建设环保局

主管部门：喀什经济开发区规划建设环保局

委托单位：喀什经济开发区财政金融局

评价机构：新疆鸿晟达信息咨询有限公司

主评人：路振志

二〇二四年七月

报告摘要

应喀什经济开发区财政金融局委托，新疆鸿晟达信息咨询有限公司（以下简称：“我公司”）对 2023 年喀什经济开发区规划土地建设环保局实施的喀什经济开发区深喀大道东延段与 G3012 高速路连接线项目开展了绩效评价工作并形成绩效评价报告，评价情况如下：

一、项目概述

（一）项目概况

项目名称：喀什经济开发区深喀大道东延段与 G3012 高速路连接线项目(以下简称“该项目”或“项目”)

项目背景：高速道路的建设对社会有着深远的影响，首先，高速道路的建设给人们带来了快捷便利，大幅缩短了人们出行的时间成本，提高了效率，相应地带动了经济的增长，拉动了旅游，酒店等消费，随着道路的建设加速了城市的发展，为有效促进地方和区域经济增长，加快地方基础设施建设，改善提升规划区内的城镇基础设施水平，根据发展改革和经济促进局 2021 年 09 月 29 日印发《关于深喀大道东延段与 G3012 高速路连接线项目的立项批复文件》（喀经开发促〔2021〕66 号）文件立项实施。项目建设主要内容为规划范围内新建道路长 1125 米，其中：880 米全段宽 80 米（含电气、绿化、给水、排水、再生水及燃气工程）、225 米段渐变宽度缩小最终宽度为 12 米（不含市政管网）。

该项目有效促进地方和区域经济增长，有效加快地方基础设施建设，有效改善和提升规划区内的城镇基础设施水平，对于喀什城市发展和扩容提质、加快喀什城镇化进程具有重要的意义。

项目建设主要内容为规划范围内新建道路长 1125 米，其中：880 米全段宽 80 米（含电气、绿化、给水、排水、再生水及燃气工程）、225 米段渐变宽度缩小最终宽度为 12 米（不含市政管网）。该项目有效促进地方和区域经济增长，有效加快地方基础设施建设，将有效改善和提升规划区内的城镇基础设施水平，对于喀什城市发展和扩容提质、加快喀什城镇化进程具有重要的意义。

该项目为跨年项目，总投资 8784.15 万元，项目建设内容为规划范围内新建道路长 1125 米，其中：880 米全段宽 80 米（含电气、绿化、给水、排水、再生水及燃气工程）、225 米段渐变宽度缩小最终宽度为 12 米（不含市政管网），2023 年预算资金为 530.57 万元，支付项目进度款，其中施工费 450 万元、设计费 64.31 万元、监理费 16.26 万元，实际到位资金 530.57 万元，执行资金 530.57 万元。

（二）项目实施情况

该项目建设内容为规划范围内新建道路长 1125 米，其中：880 米全段宽 80 米（含电气、绿化、给水、排水、再生水及燃气工程）、225 米段渐变宽度缩小最终宽度为 12 米（不含市政管网），道路及附属配套工程建设，该项目有效促进地方和区域

经济增长，有效加快地方基础设施建设，将有效改善和提升规划区内的城镇基础设施水平,对于喀什城市发展和扩容提质、加快喀什城镇化进程具有重要的意义。

该项目为跨年项目，截止 2023 年 12 月底，项目已施工建设完成，未进行工程结算审核，2023 年预算资金 530.57 万元，其中建安合同价 6668.96 万元，已支付 30%即 3375.72 万元，2023 年需支付 450 万元；设计费 128.63 万元，已支付 30%即 38.59 万元,2023 年需支付 64.31 万元；监理费 229.5 万元，已支付 30%资金投入和使用情况：该项目预算资金总额为 530.57 万元，其中：财政资金 530.57 万元,其他资金 0 万元；实际到位资金 530.57 万元，其中：财政资金 530.57 万元，其他资金 0 万元，资金到位率为 100%；该项目实际支出资金总额为 530.57 万元，预算资金执行率为 100%。

(三) 绩效目标

1.总目标

该项目为跨年项目，总投资 8784.15 万元，项目建设内容为规划范围内新建道路长 1125 米，其中：880 米全段宽 80 米（含电气、绿化、给水、排水、再生水及燃气工程）、225 米段渐变宽度缩小最终宽度为 12 米（不含市政管网），该项目有效促进地方和区域经济增长，有效加快地方基础设施建设，将有效改善和提升规划区内的城镇基础设施水平,对于喀什城市发展和扩容提质、加快喀什城镇化进程具有重要的意义该项目有效促进地方

和区域经济增长，有效加快地方基础设施建设，将有效改善和提升规划区内的城镇基础设施水平，对于喀什城市发展和扩容提质、加快喀什城镇化进程具有重要的意义。

2.年度目标

喀什经济开发区深喀大道东延段与 G3012 高速路连接线项目，主要用于建设道路，新建道路长 1125 米，其中：880 米全段宽 80 米（含电气、绿化、给水、排水、再生水及燃气工程）、225 米段渐变宽度缩小最终宽度为 12 米（不含市政管网），2023 年该项目预算资金 530.57 万元，支付该项目进度款，其中施工费 450 万元、设计费 64.31 万元、监理费 16.26 万元，实际到位资金 530.57 万元，其中：财政资金 530.57 万元，其他资金 0 万元，资金到位率为 100%；该项目实际支出资金总额为 530.57 万元，预算资金执行率为 100%，项目的实施，有效促进地方和区域经济增长，有效加快地方基础设施建设。

(1) 产出目标

产出数量

“道路总长度”指标，预期指标值为 1125 米。

产出质量

“项目竣工验收合格率”指标，预期指标值为 100%。

产出时效

“项目完成及时率”指标，预期指标值为 100%。

(2) 成本目标

产出成本

“施工费尾款”指标，预期指标值为小于等于 450 万元。

“设计费尾款”指标，预期指标值为小于等于 64.31 万元。

“监理费尾款”指标，预期指标值为小于等于 16.26 万元。

(3) 项目效益目标

社会效益指标

“促进就业、带动经济发展、增加财政收入”指标，预期指标值为有效促进。

二、绩效评价情况

(一) 评价结论

通过调研、数据分析、访谈等方式，根据工作方案确定的指标体系及评分标准，对“喀什经济开发区深喀大道东延段与 G3012 高速路连接线项目”绩效进行客观评价，该项目组织比较规范，目标完成情况良好，所有指标实现了预期目标，项目最终得分为 97 分，评价级别属于“优”，其中，项目决策类指标权重 20 分，得分 19 分，得分率 95%；项目管理类指标权重 20 分，得分 18 分，得分率 90%；项目绩效类指标权重 60 分，得分 60 分，得分率 100%。

(二) 预算执行情况

喀什经济开发区深喀大道东延段与 G3012 高速路连接线项目，2023 年该项目预算资金 530.57 万元，全部用于支付该项目进度款，其中施工费 450 万元、设计费 64.31 万元、监理费 16.26 万元，实际到位资金 530.57 万元，其中：财政资金 530.57 万元，

其他资金 0 万元，资金到位率为 100%；该项目实际支出资金总额为 530.57 万元，预算资金执行率为 100%。

三、经验、问题和建议

(一) 主要经验及做法

1.在资金管理方面，项目资金及时足额到位，及时支付，资金使用符合国家法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.在项目预算编制方面，预算编制科学合理，在开展工程设计的同时加强概预算环节的控制，明确项目概预算编制、审核要求，确保工程造价的专业性、独立性和科学性。

(二) 存在问题与不足

1.项目绩效目标设置不合理

经查看该项目《项目支出绩效目标表》中内容发现，已设置项目绩效目标经济成本指标“施工费尾款 450 万元”、“设计费尾款 64.31 万元”、“监理费尾款 16.26 万元”与 2023 年预算投资额实际完成项目工作内容不匹配，项目建设内容为支付进度款，目标设置为尾款，目标设置不够合理。

2.项目实施进度较慢

该项目为跨年项目，2021 年立项开始实施建设，截止 2023 年 12 月底项目已建设完成，正在进行工程项目结算审核，项目实施进度较慢。

3.项目管理制度不健全

喀什经济开发区规划土地建设环保局根据财务内控制度审核拨付资金，但实施方案过于简化，各项工作任务时间节点要求未细化，项目档案管理有待完善，未形成完善项目资料管理机制，项目未按实施方案施工时间施工，项目合同签订不完善，项目实施内容证明材料提供不齐全，未形成正式书面材料并存档，项目资料归档不完整。

(三) 建议和改进措施

1.加强绩效目标编制培训，明确工作任务，制定切实可行的实施方案，明确项目总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，绩效目标的设置与实际工作内容相关，按照正常的业绩水平设置了预期产出效益和效果。

2.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理辦法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理辦法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。

3.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

4.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。

5. 加快项目的实施进度，尽快组织人员进行工程结算审核。

目录

喀什经济开发区深喀大道东延段与 G3012 高速路连接线项目	- 1 -
绩效评价报告	- 1 -
一、项目概述	- 1 -
(一) 项目概况	- 1 -
(二) 项目实施情况	- 2 -
(三) 绩效目标	- 3 -
“促进就业、带动经济发展、增加财政收入”指标，预期指标值为有效促进。	- 5 -
二、绩效评价情况	- 5 -
(一) 评价结论	- 5 -
(二) 预算执行情况	- 5 -
三、经验、问题和建议	- 6 -
(一) 主要经验及做法	- 6 -
(二) 存在问题与不足	- 6 -
(三) 建议和改进措施	- 7 -
一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	5

二、绩效评价工作开展情况	7
(一) 绩效评价目的、对象和范围	7
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	8
(三) 绩效评价工作过程	12
第三阶段：分析评价	14
三、综合评价情况及评价结论	14
(一) 综合评价情况	14
(二) 综合评价结论	15
四、绩效评价指标分析	16
(一) 项目决策情况	16
(二) 项目过程情况	18
(三) 项目产出情况	19
(四) 项目效益情况	21
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	21
(一) 主要经验及做法	21
(二) 存在的问题	22
六、相关建议	23
七、其他需要说明的问题	23
(一) 建立长效的预算绩效管理机制	23

(二) 常态化预警绩效监控纠偏	24
八、绩效评价结果应用	24
(一) 绩效评价结果应用次年预算安排	24
附件一：喀什经济开发区深喀大道东延段与 G3012 高 速路连接线项目综合评分表	27
附件二：喀什经济开发区深喀大道东延段与 G3012 高 速路连接线项目满意度调查问卷	44
一、问卷调查群体	44
二、问卷调查方式	44
三、计算方式	44
四、满意度调查结果分析	44
附件三：喀什经济开发区深喀大道东延段与 G3012 高 速路连接线项目现场访谈记录	45
附件四：征求部门单位意见反馈表	46

喀什经济开发区城北转化加工区公租房及配套设施等建设项目绩效评价报告

喀什经济开发区财政金融局：

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》(财监〔2021〕4号)、《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》(财预〔2021〕6号)、《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》(新财预〔2021〕49号)、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新党发〔2018〕30号)等系列文件的要求，受贵局的委托，新疆鸿晟达信息咨询有限公司承担了喀什经济开发区深喀大道东延段与G3012高速公路连接线项目的绩效评价工作并形成绩效评价报告，喀什经济开发区规划土地建设环保局负责提供与本次绩效评价相关的项目资料并保证项目资料的真实、合法、准确和完整，现将项目绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

(一) 项目概况

1.项目背景

高速道路的建设对社会有着深远的影响，首先，高速道路的建设给人们带来了快捷便利，大幅缩短了人们出行的时间成本，提高了效率，相应地带动了经济的增长，拉动了旅游，酒店等消费，随着道路的建设加速了城市的发展，为有效促进地方和区域经济增长，加快地方基础设施建设，改善提升规划区内的城镇基础设施水平，根据发展改革和经济促进局 2021 年 09 月 29 日印发《关于深喀大道东延段与 G3012 高速路连接线项目的立项批复文件》（喀经开发促〔2021〕66 号）文件立项实施。

喀什经济开发区深喀大道东延段与 G3012 高速路连接线项，项目建设主要内容为规划范围内新建道路长 1125 米，其中：880 米全段宽 80 米（含电气、绿化、给水、排水、再生水及燃气工程）、225 米段渐变宽度缩小最终宽度为 12 米（不含市政管网）。该项目有效促进地方和区域经济增长，有效加快地方基础设施建设，有效改善和提升规划区内的城镇基础设施水平，对于喀什城市发展和扩容提质、加快喀什城镇化进程具有重要的意义。

该项目为跨年项目，总投资 8784.15 万元，项目建设内容为规划范围内新建道路长 1125 米，其中：880 米全段宽 80 米（含电气、绿化、给水、排水、再生水及燃气工程）、225 米段渐变宽度缩小最终宽度为 12 米（不含市政管网），2023 年预算资金为 530.57 万元，支付项目进度款，其中施工费 450 万元、设计费 64.31 万元、监理费 16.26 万元，实际到位资金 530.57 万元，执行资金 530.57 万元。

2.项目实施主体

喀什经济开发区规划土地建设环保局为行政单位，为正县级，主要职责是：负责组织编制并实施开发区总体规划及各层次规划、计划；联系地区自然资源局，行使自然资源国土空间用途管制和自然资源资产所有者职责，不动产登记等工作；负责开发区内建设项目规划管理，依法核发项目用地预审与选址意见书、建设用地规划许可、建设工程规划许可和竣工认可书，负责房地产管理；负责开发区保障性和政策性住房管理；负责开发区物业管理的指导和监督管理；负责开发区建设监管，包括建设工程(含与工程建设有关的勘察、设计监理等服务及有关的设备材料等)权限内的招投标、施工许可、竣工验收、质量安全监督等全过程；负责开发区市政公用设施（供排水、道路广场、园林绿化等）的监督指导等工作；联系地区住房和城乡建设局，承担人民防空建设、管理，消防审查、验收职责；负责生态环境保护及污染防治管理,查处开发区范围内规划、房产、建设、环保等违法行为；负责开发区投资建设项目推进和统筹，负责制定、推进开发区重点项目实施计划，组织实施重点项目资金筹措、前期工作、施工、竣工等工作；负责开发区安全生产和应急管理工作；承接做好自治区人民政府授予的自治区级管理事项，承办党工委、党委会交办的其他事项。

喀什经济开发区规划土地建设环保局单位现有编制数 14 人。实有人数 53 人，其中：在职 16 人，比上年增加 4 人；退休 0 人，比上年增加 0 人；离休 0 人，比上年减少 0 人。

3.主要内容及实施情况

喀什经济开发区深喀大道东延段与 G3012 高速路连接线项，项目建设主要内容为规划范围内新建道路长 1125 米，其中：880 米全段宽 80 米（含电气、绿化、给水、排水、再生水及燃气工程）、225 米段渐变宽度缩小最终宽度为 12 米（不含市政管网）。该项目有效促进地方和区域经济增长，有效加快地方基础设施建设，有效改善和提升规划区内的城镇基础设施水平，对于喀什城市发展和扩容提质、加快喀什城镇化进程具有重要的意义。

该项目为跨年项目，总投资 8784.15 万元，2023 年预算资金为 530.57 万元，支付项目进度款，其中施工费 450 万元、设计费 64.31 万元、监理费 16.26 万元，实际到位资金 530.57 万元，执行资金 530.57 万元。

4.资金投入和使用情况

该项目为跨年项目，总投资 8784.15 万元，2023 年预算资金为 530.57 万元，用于支付项目进度款，其中施工费 450 万元、设计费 64.31 万元、监理费 16.26 万元，实际到位资金 530.57 万元，资金到位率 100%，执行资金 530.57 万元，资金执行率 100%。

5.项目组织及管理情况

(1)项目组织情况

喀什经济开发区规划土地建设环保局组织政府喀什经济开发区深喀大道东延段与 G3012 高速路连接线项目，审核汇总具体资金，通过业务与财务工作共同配合衔接，形成了明确责任分工的项目管理制度，并按照开发区规定、监督检查制度、预算绩

效管理办法等相关制度办法严格落实各环节工作，及时合理支付项目资金。

(2)项目管理情况

本项目由陈剑锋作为项目负责人，负责该项目的全盘组织实施；业务工作人员负责袁鹤林；财务负责人王金按照项目负责人提供的依据和发票等按项目进度向财政申请支付资金；通过业务与财务工作共同配合衔接，形成了明确责任分工的项目管理制度，并按照监督检查制度、预算绩效管理办法等相关制度办法严格落实各环节工作。

(3)项目财务管理情况

该项目资金由喀什经济开发区规划建设环保局向喀什经济开发区财政金融局提交资金申请报告，经财经会批复后，由财政核拨，即由喀什经济开发区财政金融局将资金直接拨付至中国农发重点建设基金有限公司账户，严格按照国库集中支付制度支付资金。

(二)项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标

该项目为跨年项目，总投资 8784.15 万元，项目建设内容为规划范围内新建道路长 1125 米，其中：880 米全段宽 80 米（含电气、绿化、给水、排水、再生水及燃气工程）、225 米段渐变宽度缩小最终宽度为 12 米（不含市政管网），该项目有效促进

地方和区域经济增长，有效加快地方基础设施建设，有效改善和提升规划区内的城镇基础设施水平，对于喀什城市发展和扩容提质、加快喀什城镇化进程具有重要的意义。

2.阶段性目标

喀什经济开发区深喀大道东延段与 G3012 高速路连接线项目，主要用于建设道路，新建道路长 1125 米，其中：880 米全段宽 80 米（含电气、绿化、给水、排水、再生水及燃气工程）、225 米段渐变宽度缩小最终宽度为 12 米（不含市政管网），2023 年该项目预算资金 530.57 万元，用于支付该项目进度款，其中施工费 450 万元、设计费 64.31 万元、监理费 16.26 万元，实际到位资金 530.57 万元，其中：财政资金 530.57 万元，其他资金 0 万元，资金到位率为 100%；该项目实际支出资金总额为 530.57 万元，预算资金执行率为 100%，项目的实施，有效促进地方和区域经济增长，有效加快地方基础设施建设。

具体绩效目标

本项目预算资金 530.57 万元，设置 3 个一级指标，5 个二级指标，7 个三级指标，其中包括：

(1)项目产出目标

产出数量

“道路总长度”指标，预期指标值为 1125 米。

产出质量

“项目竣工验收合格率”指标，预期指标值为 100%。

产出时效

“项目完成及时率”指标，预期指标值为 100%。

(2)成本目标

产出成本

“施工费尾款”指标，预期指标值为小于等于 450 万元。

“设计费尾款”指标，预期指标值为小于等于 64.31 万元。

“监理费尾款”指标，预期指标值为小于等于 16.26 万元。

(3)项目效益目标

社会效益指标

“促进就业、带动经济发展、增加财政收入”指标，预期指标值为有效促进。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

绩效评价的目的是发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，同时总结提炼项目和部门的经验做法，为预算部门改进、完善项目管理和预算管理提供可行性参考建议。也为下一年度预算编制与评审提供充分有效的

依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2.绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，对喀什经济开发区深喀大道东延段与G3012高速路连接线项目展开评价，主要评价该项目的投入、产出及效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价范围主要围绕项目决策情况、项目管理、产出情况、效益情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、以及其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）依法依规原则。绩效评价各个环节，充分体现依法依规要求，严格按照规定的管理程序和方法运作。

（2）科学规范原则。落实相关政策文件情况，按照科学可行的要求，采取定性与定量相结合的分析方法，严格遵守规定程序。

（3）客观公正原则。绩效评价人员本着客观、公正的态度进行项目评价，评价结果依法公开，并接受公众监督。

（4）绩效相关原则。在进行绩效评价时，重点关注项目产

出情况，包括资金支付与项目实施进度，并对其进行比较，准确反映出二者的关系。

（5）激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（6）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

2.评价指标体系

本次绩效评价指标体系按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10号）文件要求设置，由决策、过程、产出、效益4个一级指标。10个二级指标、17个三级指标构成。

一级指标为：决策（20分）、过程（20分）、产出（40分）、效益（20分），共计100分。

二级指标为：项目立项（5分）、绩效目标（5分）、资金投入（10分）、资金管理（15分）、组织实施（5分）、产出数量（10分）、产出质量（10分）、产出时效（10分）、产出成本（10分）、项目效益（20分），共计100分。

三级指标为：立项依据充分性（3分）、立项程序规范性（2分）、绩效目标合理性（3分）、绩效指标明确性（2分）、预算编制科学性（5分）、资金分配合理性（5分）、资金到位率

(5分)、预算执行率(5分)、资金使用合规性(5分)、管理制度健全性(2分)、制度执行有效性(3分)、实际完成率(10分)、质量达标率(10分)、完成及时性(10分)、成本节约率(10分)、实施效益(10分)、服务对象满意度(10分),共计100分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策 (20分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (3分)	3
		立项程序规范性 (2分)	2
	绩效目标 (5分)	绩效目标 (3分)	3
		绩效指标 (2分)	2
	资金投入 (10分)	预算编制 (5分)	5
		资金分配合理性 (5分)	5
过程 (20分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	5
		预算执行率 (5分)	5
		资金使用合规性 (5分)	5
	组织实施 (5分)	管理制度健全性 (2分)	2
		制度执行 (3分)	3
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	10
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	10
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	10
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	10
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	10

一级指标	二级指标	三级指标	分值
		满意度（10分）	10
合计			100

3.绩效评价方法

本次评价的方法按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）要求，主要采取比较法和调查法。一是比较法。对项目支出情况及建设后的产出及效果与项目实施计划目标进行比较，分析预计目标的完成程度。二是调查法（包括现场调查和问卷调查）。现场调查是通过现场抽查、询问等方法，对项目效益等指标进行复核性评价。问卷调查是针对项目区利益相关方实施的调查，并对调查结果进行统计、分析和评定。

4.绩效评价标准

本次绩效评价坚持“目标引领、系统评价、科学客观”的总体工作思路，采取现场评价和非现场评价相结合，坚持定量优先、简便有效的原则。遵循定量为主，定量、定性相结合的原则。参照采集的相关数据材料制订评价标准；采用比较法、文献法、社会调查法、实地核查法等方法进行综合评价，形成总体评价结论。具体评价方法如下：

（1）比较法：通过整理该项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。

(2) 文献法：通过检索、查阅、梳理本项目相关的文件制度、会议纪要、单位职能、管理办法等相关材料，了解本项目立项依据的充分性及立项的规范性。

(3) 社会调查法：社会调查是深入了解项目参与主体和利益相关方对项目认知及态度的主要方法，同时也是搜集标准统计数据的有效途径。绩效评价工作小组将采用实地访谈、问卷调查等方法对项目进行深入调研，充分的掌握项目的内容、实施过程、实施效果等，为评价指标评分和结果分析提供支撑。

(4) 实地核查法：通过核查实施单位专项资金凭证及账册，核实项目资金拨付时间、金额等，核实各项支出是否按照相关财务管理制度、合同约定等执行，是否存在超范围列支的情况。

(三) 绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备

我公司作为专业第三方机构，承担本项目评价职责，成立绩效评价工作小组，组长：路振蕊，成员：艾合麦提江、李渊、路正敏，按绩效评价工作程序开展绩效评价工作，具体分工如下：

序号	姓名	职务	责任分工	联系电话
1	路振蕊	项目组长	复核评价报告及工作资料，终审评价报告	18299661021
2	路正敏	项目助理	复核评价报告及工作资料，复核评价报告	18294900402
3	李渊	项目助理	搜集项目资料，审核项目，撰写报告。	19609980392
4	艾合买提江	项目助理	搜集项目资料，审核项目，撰写报告。	17590289059

(1) 原始资料查阅

评价小组在喀什经济开发区规划土地建设环保局全力配合协助下，收集项目相关背景资料、项目目标、预算资料、项目执行管理资料、项目资金支付资料，对项目相关信息进行深入分析。根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目的特点，梳理绩效评价总体思路，形成项目评价指标体系。

(2) 确定评价思路和方法

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，制定项目绩效评价指标体系，主要围绕项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益。通过问卷、访谈等方式获取评价数据，明确工作方法和步骤，制定科学合理的工作计划。

第二阶段：组织实施

(1) 采集评价基础数据及相关资料

全面收集项目相关资料和基础数据，完成绩效评价内容和评价指标体系的评价印证资料。整理该项目主要采用查阅相关文件政策、会计凭证等资料，采集项目资金支出情况、项目完成情况及项目成本构成等数据资料；并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

(2) 实地调研

项目评价组根据项目实施过程及指标评价需求判断，针对项目进行实地调研考察，进行实地调研检查项目资金使用情况，重

点关注资金使用是否存在截留、挪用财政专项资金的情况；资金支付审批情况是否合规；资金支付所需材料是否齐备；是否存在擅自改变、扩大支出范围的情况；是否存在擅自提高支出标准、虚列项目支出等情况。

第三阶段：分析评价

一是根据所收集的资料，结合现场勘查等有关情况，整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。二是按照确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，量化评分，形成评价初步结论。

第四阶段：撰写报告

归纳整体项目情况与存在问题，征求喀什经济开发区财政金融局意见，并结合反馈意见，撰写绩效评价报告。

第五阶段：归集档案

将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

项目决策方面：根据发展改革和经济促进局 2021 年 09 月 29 日印发《关于深喀大道东延段与 G3012 高速路连接线项目的立项批复文件》（喀经开发促〔2021〕66 号）文件立项实施，立项依据充分，项目预算资金根据道路施工量数核定，经本级财政部门与上级财政部门复核，立项程序规范，预算编制精准，与

项目内容契合,绩效目标编制科学合理,能最大体现资金的效益。

项目管理方面:该项目预算安排资金 530.57 万元,到位资金 530.57 万元,实际支出 530.57 万元,预算执行率 100%,项目资金使用按照规土局上报管委会会议议题第五条支付,使用合规,项目财务管理制度健全,财务监控到位,所有资金支付按照国库集中支付制度严格执行。

项目产出方面:产出数量“道路总长度”指标,完成值 1125 米。产出质量“项目竣工验收合格率”指标,完成值为 100%。产出时效“项目完成及时率”指标,完成值为 100%。

项目效益方面:通过实施本项目喀什经济开发区深喀大道东延段与 G3012 高速路连接,有效促进就业、带动经济发展、增加财政收入。

(二) 综合评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)文件,绩效评价总分设置为 100 分,划分为四档:90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、70(含)-80 分为中、70 分以下为差。

运用由项目组制订评价指标体系及评分标准,该项目最终评分 97 分,绩效评级为“优”,具体得分情况为:项目决策 19 分、项目过程 18 分、项目产出 40 分、项目效益 20 分。

深喀大道东延段与 G3012 高速路连接线项目得分情况表

一级指标	权重	得分率	实际得分
------	----	-----	------

一级指标	权重	得分率	实际得分
项目决策	20	95%	19
项目过程	20	90%	18
项目产出	40	100%	40
项目效益	20	100%	20
合计	100	97%	97

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19分，得分率为95%。

三级指标	权重	得分率	实际得分
立项依据充分性	3	100%	3
立项程序规范性	2	100%	2
绩效目标合理性	3	66.66%	2
绩效指标明确性	2	100%	2
预算编制科学性	5	100%	5
资金分配合理性	5	100%	5
合计	20	95%	19

（1）立项依据充分性：根据发展改革和经济促进局2021年09月29日印发《关于深喀大道东延段与G3012高速路连接线项目的立项批复文件》（喀经开发促〔2021〕66号）文件立

项实施，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划，项目立项与部门职责范围相符。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：项目根据规土局上报管委会会议议题第五条设立，由喀什经济开发区规划土地建设环保局制定方案提出申请，根据发展改革和经济促进局2021年09月29日印发《关于深喀大道东延段与G3012高速路连接线项目的立项批复文件》（喀经开发促〔2021〕66号）文件立项实施，财政金融局审核批准，项目立项规范，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：经查看该项目《项目支出绩效目标表》中内容发现，已设置项目绩效目标经济成本指标“施工费尾款450万元”、“设计费尾款64.31万元”、“监理费尾款16.26万元”与2023年预算投资额实际完成项目工作内容不匹配，项目建设内容为支付进度款，目标设置为尾款，目标设置不够合理，根据评分标准，该指标扣1分，得2分。

（4）绩效指标明确性：通过查看该项目《绩效目标申报表》，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性：通过查看规土局上报管委会会议议题第五条以及项目预算编制草案，该项目预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

(6) 资金分配合理性：项目资金预算草案由喀什经济开发区规划土地建设环保局制定，财政金融局审核，资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

(二) 项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分18分，得分率为90%。

三级指标	权重	得分率	实际得分
资金到位率	5	100%	5
预算执行率	5	100%	5
资金使用合规性	5	100%	5
管理制度健全性	2	50%	1
制度执行	3	66%	2
合计	20	90%	18

(1) 资金到位率：该项目预算资金530.57万元。截至2023年12月31日，资金到位合计530.57万元，资金到位率100%。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

(2) 预算执行率：该项目预算执行资金530.57万元，执行率达100%。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

(3) 资金使用合规性：资金支出符合规土局上报管委会会议议题第五条及单位财务内控制度，资金使用合规，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

(4) 管理制度健全性：根据财务内控制度审核拨付资金，但实施方案过于简化，各项工作任务时间节点要求未细化，项目档案管理有待完善，未形成完善项目资料管理机制，项目未按实施方案施工时间施工，项目合同签订不完善，项目实施内容证明材料提供不齐全，未形成正式书面材料并存档，项目资料归档不完整，根据评分标准，该指标扣 1 分，得 1 分。

(5) 制度执行有效性：根据财务内控制度审核拨付资金，但实施方案过于简化，各项工作任务时间节点要求未细化，项目档案管理有待完善，未形成完善项目资料管理机制，项目未按实施方案施工时间施工，项目合同签订不完善，项目实施内容证明材料提供不齐全，未形成正式书面材料并存档，项目资料归档不完整，该指标扣 1 分，得 2 分。

(三) 项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由 4 个三级指标构成，权重分为 40 分，实际得分 40 分，得分率为 100%。

三级指标	权重	得分率	实际得分
------	----	-----	------

产出数量	10	100%	10
产出质量	10	100%	10
产出时效	10	100%	10
成本情况	10	100%	10
合计	40	100%	40

1.对于“产出数量”

道路总长度，预期目标是 1125 米，实际完成 1125 米，指标完成率 100%。所设分值为 10 分，实际得分为 10 分。

合计得 10 分。

2.对于“产出质量”

项目竣工验收合格率，预期目标是等于 100%，实际完成 100%，指标完成率 100%。所设分值为 10 分，实际得分为 10 分。

合计得 10 分。

3.对于“产出时效”

项目完成及时率，预期目标是等于 100%，实际完成 100%，指标完成率 100%。所设分值为 10 分，实际得分为 10 分。

合计得 10 分。

4.对于“产出成本”

“对于产出成本指标”：

“施工费尾款”指标，预期指标值为小于等于 300 万元。

“设计费尾款”指标，预期指标值为小于等于 100 万元。

“监理费尾款”指标，预期指标值为小于等于 110 万元。

“产出成本预计环评等费用”指标，预期指标值为小于等

于 20.57 万元，指标完成率 100%。所设分值为 20 分，实际得分为 20 分。

实施效益指标合计得 20 分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益及满意度一个方面的内容，由 1 个三级指标构成，权重分为 30 分，实际得分 30 分，得分率为 100%。

三级指标	权重	得分率	实际得分
实施效益	30	100%	30
满意度	0	0	0
合计	30	100%	30

实施效益指标

对于“社会效益指标”：

促进就业、带动经济发展、增加财政收入，预期目标是有效促进，实际完成有效提升，指标完成率 100%。所设分值为 30 分，实际得分为 30 分。

3.量化率

根据实际工作计划量化率达到 88.9%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.在资金管理方面，项目资金及时足额到位，及时支付，资

金使用符合国家法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.在项目预算编制方面，预算编制科学合理，在开展工程设计的同时加强概预算环节的控制，明确项目概预算编制、审核要求，确保工程造价的专业性、独立性和科学性。

（二）存在的问题

1.项目绩效目标设置不合理

经查看该项目《项目支出绩效目标表》中内容发现，已设置项目绩效目标经济成本指标“施工费尾款 450 万元”、“设计费尾款 64.31 万元”、“监理费尾款 16.26 万元”与 2023 年预算投资额实际完成项目工作内容不匹配，项目建设内容为支付进度款，目标设置为尾款，目标设置不够合理。

2.项目实施进度较慢

该项目为跨年项目，2021 年立项开始实施建设，截止 2023 年 12 月底项目已建设完成，正在进行工程项目结算审核，项目实施进度较慢。

3.项目管理制度不健全

喀什经济开发区规划土地建设环保局根据财务内控制度审核拨付资金，但实施方案过于简化，各项工作任务时间节点要求未细化，项目档案管理有待完善，未形成完善项目资料管理机制，项目未按实施方案施工时间施工，项目合同签订不完善，项目实

施内容证明材料提供不齐全，未形成正式书面材料并存档，项目资料归档不完整。

六、相关建议

1.加强绩效目标编制培训，明确工作任务，制定切实可行的实施方案，明确项目总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，绩效目标的设置与实际工作内容相关，按照正常的业绩水平设置了预期产出效益和效果。

2.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理方法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招标投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。

3.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

4.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。

5. 加快项目的实施进度，尽快组织人员进行工程结算审核。

七、其他需要说明的问题

(一) 建立长效的预算绩效管理机制

逐步建立和完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管

理机制。

（二）常态化预警绩效监控纠偏

各预算单位对绩效监控过程中发现的问题自行纠正。各级财政部门对审核中发现的问题，向本级部门单位反馈意见及整改要求，督促本级部门单位逐一对照核查，深入分析问题存在的原因，及时整改落实。

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

八、绩效评价结果应用

（一）绩效评价结果应用次年预算安排

为有效提高财政预算资金的经济性、效率性和公平性，建议将本次绩效评价结果作为预算单位次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。对绩效评价结果为“优秀”和“良好”的项目，建议根据相关政策制度，结合喀什经济开发区党委工作安排以及本级财力情况等因素，原则上优先予以保障。对绩效评价结果为“一般”的项目，该项目预算单位应针对性提出整改措施，落实到位，喀什经济开发区财政金融局在编制次年该预算单位同类型项目支出时，按比例扣减预算，具体扣减比例计算方式为： $(80 - \text{项目绩效评价结果得分}) / 100$ 。对绩效评价结果“较差”的项目，原则上不在次年预算中给予安排。

绩效评价结果公示公开，接受上级部门及社会公众监督积极

推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开。按照政府信息公开有关规定，由喀什经济开发区财政金融局将本次绩效评价的结果信息进行公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

通过调研、数据分析、访谈等方式，根据工作方案确定的指标体系及评分标准，对“喀什经济开发区深喀大道东延段与G3012高速路连接线项目”绩效进行客观评价，该项目组织比较规范，目标完成情况良好，所有指标实现了预期目标，项目最终得分为97分，评价级别属于“优”，其中，项目决策类指标权重20分，得分19分，得分率95%；项目管理类指标权重20分，得分18分，得分率90%；项目绩效类指标权重60分，得分60分，得分率100%。

后附附件：

附件一：喀什经济开发区深喀大道东延段与G3012高速路连接线项目综合评分表

附件二：喀什经济开发区深喀大道东延段与G3012高速路连接线项目满意度调查问卷

附件三：喀什经济开发区深喀大道东延段与G3012高速路连接线项目现场访谈记录

附件四：征求部门单位意见反馈表

新疆鸿晟达信息咨询有限公司
二〇二四年七月

附件一：喀什经济开发区深喀大道东延段与 G3012 高速路连接线项目综合评分表

一级指 标	二级指 标	三级指 标	标杆值	评价标准	评分过程	完成值	实际得 分
决策(20 分)	项目立 项(5分)	立项依 据充分性(3 分)	充分	①项目立项是 否符合国家法律法 规、国民经济发展 规划和相关政策； ②项目立项是否符 合行业发展规划和 政策要求；③项目 立项是否与部门职 责范围相符，属于 部门履职所需；④	(1) 立项依 据充分性：该项目 依据规土局上报 管委会会议议题 第五条设立实施。 项目立项符合国 家法律法规、国民 经济发展规划，项 目立项与部门职 责范围相符。根据	充分	3

			项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	评分标准，该指标不扣分，得3分。		
	立项程序规范性（2分）	规范	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、	项目根据规土局上报管委会会议议题第五条设立，由喀什经济开发区规划土地建设环保局制定方案提出申请，财	规范	2

			风险评估、绩效评估、集体决策。	政金融局审核批准，项目立项规范，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。		
绩效目标（5分）	绩效目标合理性（3分）	合理	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	经查看该项目《项目支出绩效目标表》中内容发现，已设置项目绩效目标经济成本指标“施工费尾款450万元”、“设计费尾款64.31万元”、“监理费尾款16.26万元”与	合理	2

			配。	2023 年预算投资额实际完成项目工作内容不匹配，项目建设内容为支付进度款，目标设置为尾款，目标设置不够合理，该指标扣 1 分，得 2 分。		
	绩效指标明确性（2 分）	明确	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是	通过查看该项目《绩效目标申报表》，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该	明确	2

			否与项目目标任务数或计划数相对应。	指标不扣分，得2分。		
资金投入（10分）	预算编制科学性（5分）	科学	<p>①预算编制是否经过科学论证；</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>	<p>通过查看规土局上报管委会会议议题第五条以及项目预算编制草案，该项目预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标扣不分，得5分。</p>	科学	5

		资金分配合理性（5分）	合理	<p>①预算资金分配依据是否充分；</p> <p>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。</p>	<p>项目资金预算草案由喀什经济开发区规划土地建设环保局制定，财政金融局审核，资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。</p>	合理	5
过程（20分）	资金管理（15分）	资金到位率（5分）	100%	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内</p>	<p>该项目预算资金530.57万元。截至2023年12月31日，资金到位合计530.57万元，资金到位率</p>	100%	5

			<p>落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p>	<p>100%。根据评分标准,该指标不扣分,得5分。</p>			
		<p>预算执行率(5分)</p>	<p>100%</p>	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p>	<p>该项目预算执行资金 530.57 万元,执行率达 100%。根据评分标准,该指标不扣分,得5分。</p>	<p>100%</p>	<p>5</p>

	资金使用合规性（5分）	合规	<p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	项目资金预算草案由喀什经济开发区规划土地建设环保局制定，财政金融局审核，资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。	合规	5
组织实施（5分）	管理制度健全性（2分）	健全	①是否已制定或具有相应的财务	项目管理制度不健全	健全	1

		分)	和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	喀什经济开发区规划土地建设环保局根据财务内控制度审核拨付资金，但实施方案过于简化，各项工作任务时间节点要求未细化，项目档案管理有待完善，未形成完善项目资料管理机制，项目未按实施方案施工时间施工，项目合同签订不完善，项目实	
--	--	----	-----------------------------------	--	--

					施内容证明材料提供不齐全,未形成正式书面材料并存档,项目资料归档不完整该指标扣1分,得1分。		
		制度执行有效性(3分)	有效	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施	项目管理制度不健全 喀什经济开发区规划土地建设环保局根据财务内控制度审核拨付资金,但实施方案过于简化,各项工作任务时间	有效	2

			<p>的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>	<p>节点要求未细化，项目档案管理有待完善，未形成完善项目资料管理机制，项目未按实施方案施工时间施工，项目合同签订不完善，项目实施内容证明材料提供不齐全，未形成正式书面材料并存档，项目资料归档不完整该指标扣1分，得2分。</p>	
--	--	--	--------------------------------	--	--

产出(40分)	产出数量(10分)	实际完成率(10分)	=1125米	<p>实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。</p>	<p>道路总长度, 预期目标是 1125 米, 实际完成 1125 米, 指标完成率 100%。所设分值为 10 分, 实际得分为 10 分。</p>	=1125米	10
---------	-----------	------------	--------	---	---	--------	----

	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	=100%	<p>质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	<p>项目竣工验收合格率,预期目标是等于 100%,实际完成 100%,指标完成率 100%。所设分值为 10 分,实际得分为 10 分。</p> <p>合计得 10 分。</p>	=100%	10
--	------------	-------------	-------	--	--	-------	----

产出时 效 (10 分)	完成及 时性 (10 分)	=100%	实际完成时 间：项目实施单位 完成该项目实际所 耗用的时间。计划 完成时间：按照项 目实施计划或相关 规定完成该项目所 需的时间。	项目完成及 时率,预期目标是 等于 100%, 实际 完成 100%, 指标 完成率 100%。所 设分值为 10 分, 实际得分为 10 分。 合计得 10 分。	=100%	10
产出成 本 (10 分)	成本节 约率 (10 分)	=100 万 元, =20.57 万 元	成本节约率 =[(计划成本-实际 成本)/计划成本] × 100%。实际成 本：项目实施单位	“对于产出 成本指标”： “施工费尾 款”指标,预期指 标值为小于等于	=100 万元, =20.57 万元	10

			如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	300 万元。 “设计费尾款”指标，预期指标值为小于等于100 万元。 “监理费尾款”指标，预期指标值为小于等于110 万元。 “产出成本预计环评等费用”指标，预期指标值为小于等于 20.57 万元，指标完成率	
--	--	--	--	--	--

					100%。所设分值为 10 分，实际得分为 10 分。		
效益(20分)	项目效益(20分)	实施效益(10分)	有效提升	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	促进就业、带动经济发展、增加财政收入,预期目标是有效促进,实际完成有效提升,指标完成率100%。所设分值为 20 分,实际得分为 20 分。	有效提升	20
		满意度(0分)	≥95%	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响	受益对象满意度,实际得分10分,得分率为	=100%	0

				的部门（单位）、 群体或个人。一般 采取社会调查的方 式。	100%。合计得 10 分。		
合计						3	97

附件二：喀什经济开发区深喀大道东延段与 G3012 高速路 连接线项目满意度调查问卷

一、问卷调查群体

本次满意度调查问卷调查对象是受益单位及受益个人。

二、问卷调查方式


本次采用抽样调查方式，对受益对象进行抽样调查，在项目单位协助下，共发放 11 份调查问卷。

三、计算方式

满意度=调查结果为“是”统计数/回收问卷数*100%。

四、满意度调查结果分析

为客观评价财务核算检查项目满意度情况，本次抽样发放满意度调查问卷 11 份，回收 11 份，具体如下：

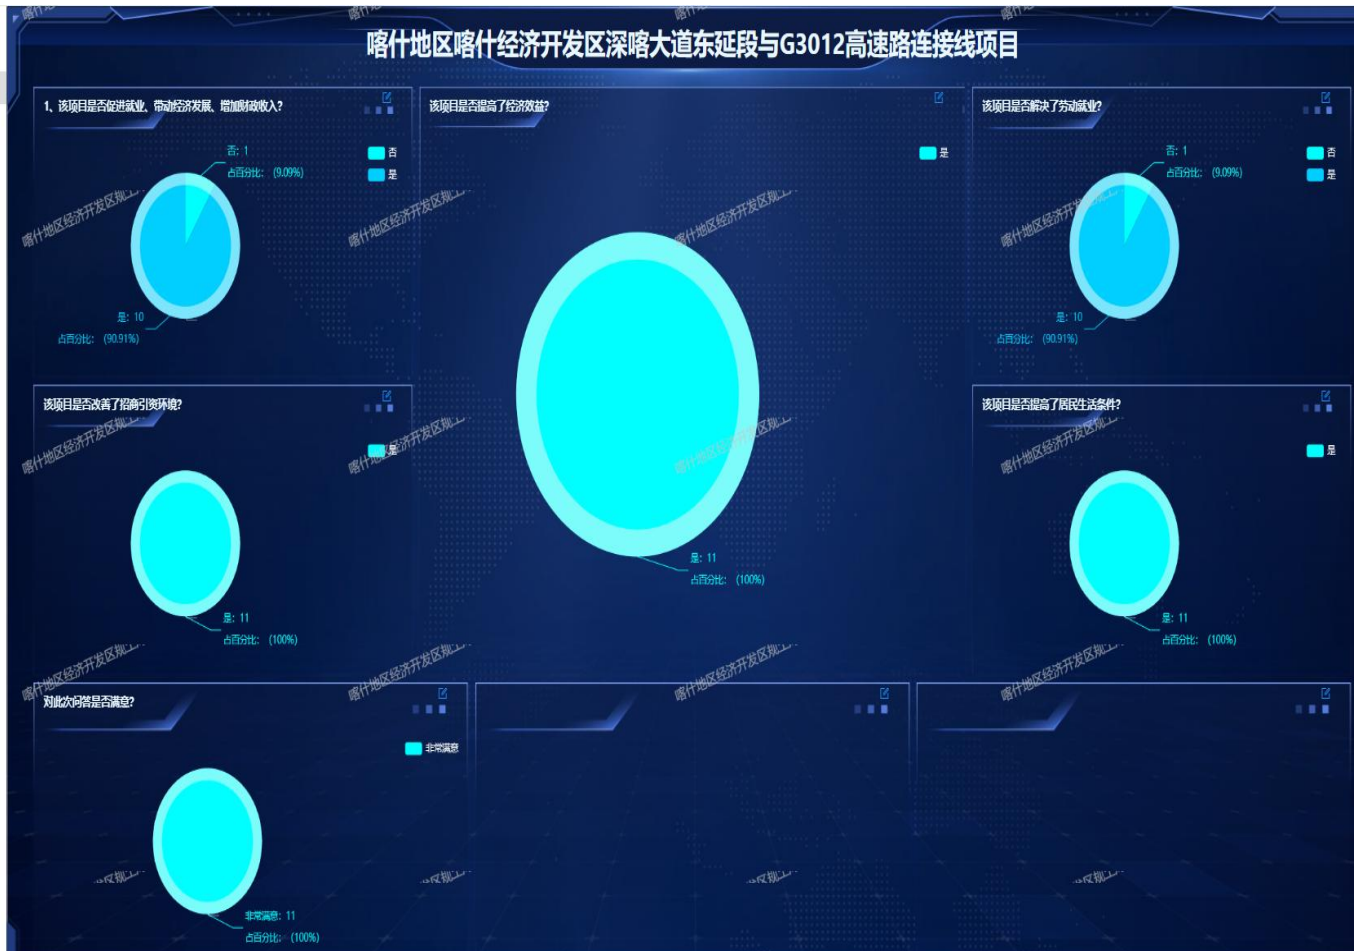

附件三：喀什经济开发区深喀大道东延段与 G3012 高速路
连接线项目现场访谈记录

现场访谈记录			
预算单位	喀什经济开发区规划土地建设环保局	访谈地点	潮州协 冯楼
访谈参加人员	陈云峰		
访谈内容	<p>本次访谈主要从喀什经济开发区深喀大道东延段与G3012高速路连接线项目的立项情况，项目管理情况，项目实施的实现情况，项目资金执行情况，项目效益等五个方面进行访谈。</p> <p>1.项目立项情况：主要了解项目立项依据是否充分，程序是否规范。</p> <p>2.项目管理情况：主要了解管理制度是否健全，制度是否执行。</p> <p>3.项目实施的实现情况：主要了解项目产出实际完成情况、质量达标情况、完成及时性、成本节约情况。</p> <p>4.项目资金执行情况：主要了解预算编制与执行情况，资金分配是否合理，资金使用是否合规。</p> <p>5.项目效益：主要了解项目实施后产生的实施效益以及满意度情况。</p>		
项目负责人：	陈云峰	第三方服务机构：	艾凌提 辨制

附件四：征求部门单位意见反馈表

绩效评价报告反馈意见单			
项目名称	喀什经济开发区深喀大道东延段与G3012高速路连接线项目	预算金额 (万元)	530.57万元
工作内容	结合实际，出具贵单位财政绩效评价报告。		
服务小组成员	路振蕊、路振敏、艾合麦提江、李瀚		
工作态度	好(√) 一般() 差()		
工作质量	好(√) 一般() 差()		
工作纪律	好(√) 一般() 差()		
职业道德	吃请委托单位() 索要委托单位() 其他()		
满意度	满意(√) 不满意()		
<p>受喀什经济开发区财政金融局委托，已对贵单位的该项目出具绩效评价报告，为听取单位意见，改进我们的工作，请贵单位对评价报告审核确认并反馈意见建议，如有重大事项可书面或电话反馈，我们将诚恳接受并加以改进，谢谢合作！</p>			
评价意见和建议：			
